РесурсПроект

ООО «РесурсПроект»
ИНН 5024164046, КПП 502401001
ОГРН 1165024052830
143404, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Дачная, д. 11А, пом. 14/28, комн. 02
www.res-proekt.ru

ОБЪЕКТ · 14.10.2026

Подготовка помещений к капитальному ремонту: демонтаж на 4–7 этажах здания на Зелёном проспекте, 7

Заказчик: АО «Группа компаний «Медси»

Объект: клиника формата КШП

Адрес: г. Москва, Зелёный проспект, д. 7

Договор: № УК08-Р-СМР-26-014-00 от 07.04.2026

Площадь: 3572 м² (помещения 4, 5, 6 и 7 этажей)

Что нужно было сделать:

- обследование и обмеры, фиксация инженерных сетей под разборку, таблицы отходов, регистрация в АИС ОССиГ;
- устройство строительных мусоропроводов;
- разборка инженерных систем: освещение, электроснабжение, водоснабжение и канализация, вентиляция и кондиционирование, слаботочные сети;
- снятие отделки: полы и стяжки, стены, потолки, двери, подоконники, откосы;
- снос ненесущих перегородок из кирпича и гипсокартона;
- сортировка, погрузка в контейнеры, вывоз и утилизация строительного мусора.

Статус:

- строительная площадка принята по акту от 22.04.2026;
- площадка огорожена, подъезды усилены дорожными плитами (фото 29.05.2026);
- демонтаж отделки, перегородок и инженерных сетей на этажах — фото от 17.07.2026;
- итоговые акты приёмки в папке объекта не найдены.

Объект на карте: открыть на Яндекс Картах



Здание на Зелёном проспекте, 7 — фасад, февраль 2026

До начала работ

Обследование помещений 11.02.2026.



Коридор этажа — до демонтажа



Кабинет — отделка и потолок «Армстронг»



Помещение — мебель и оборудование



Шахта — инженерные сети под разборку

Организация площадки




Ограждение — площадка у здания, май 2026



Подъезд — дорожные плиты для техники



Вывоз мусора — погрузка автокраном

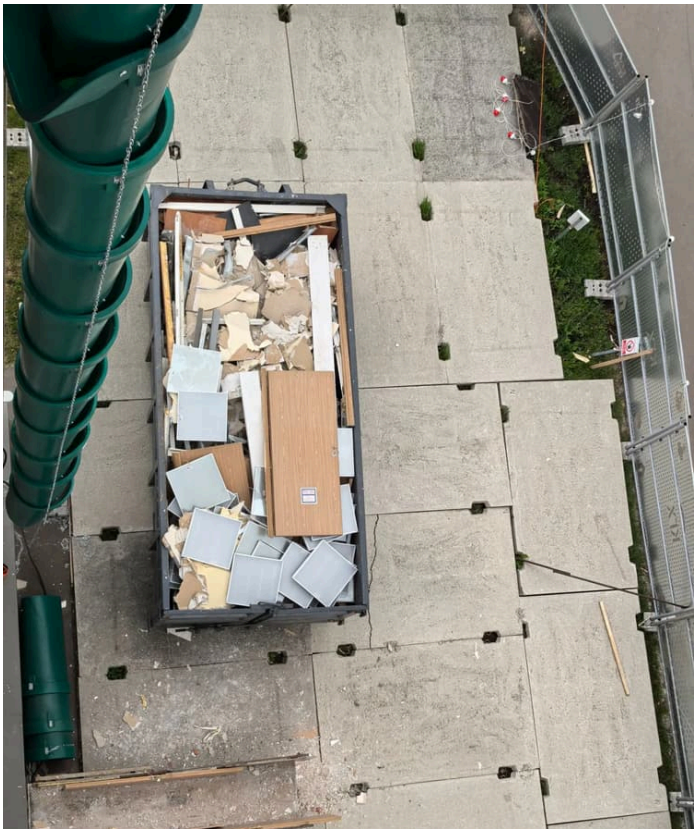


Контейнер — отходы демонтажа

Демонтаж на этажах

Фото 17.07.2026.



Этаж — разборка отделки и перегородок

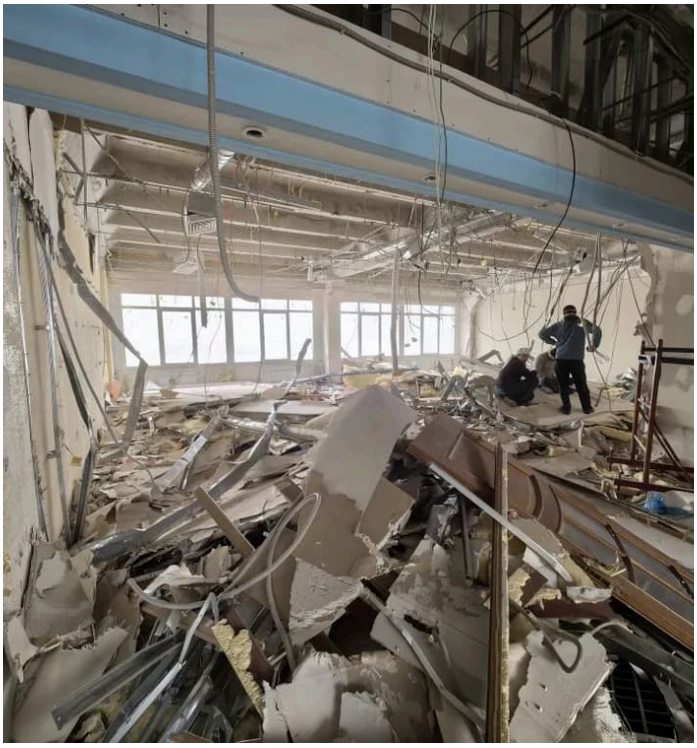

Этаж — демонтаж потолков и сетей



Этаж — после сноса перегородок



Этаж — помещения расчищены до конструкций

ООО «РесурсПроект» · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru
